

**ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA  
DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Em dezesete de agosto do ano de dois mil e três às três horas e trinta e quatro minutos, Pizzaria Fernandão: Praça Manoel Lino Mol - Barra Longa, MG - Teve início a 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Antes, no período das 14:00h às 15:00h foi realizada reunião interna, restrita aos membros da Câmara Técnica, atingidos, assessorias técnicas e convidados. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

**Participantes da 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 15h34min às 18h22min – Dia 17/08/2023.**

**Registro dos Participantes, que estavam na mesa e realizaram apresentação conforme consta na gravação**

Antônio Áureo (Rio Doce), Bruna da Silva Lopes (Rio Doce), Carlos Sena (Renova), (Renova), Caroline Braga (Flasco), Cristiane (Atingida Comissão de Barra Longa), Ernestina (Atingida), Francine Aparecida Souza (SETRANS), Gustavo Castro (Samarco), Helen Roberta de Oliveira Araújo (SEMAD), Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros (SEINFRA), Laura Atingida (Barra Longa), Marcia (Atingida de Barra Longa), Marcia Atingida Comissão de Barra Longa, Maria das Graças (Atingida de Gesteira), Mariana Ferreira (EY), Thiago Fernandes dos Santos (Renova)Rafaela (EY), Sérgio do Carmo(Garimpeiros MG), Sergio Ferreira Lima Filho(Renova), Úrsula Vasconcelos (Samarco), Valeria Silva (Atingida Comissão de Barra Longa) e Vaneide Carvalho (SEINFRA). Da lista de presença segue anexo.



LISTA DE PRESENÇA  
70ª REUNIÃO ORDIN

**1) Informes Gerais**

**1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 69ª**

**Discussão**

A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, saudou a todos os presentes e os consultou ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 69ª Reunião Ordinária que colocada em votação foi aprovada, sem objeções e explicou que faria a inversão da Pauta.  
**\*Ata conforme a Pauta**


**2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.**

**2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.**

**2.2) Apresentação status do monitoramento do PG8.**

**Discussão**

**2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3 nº 1042050-07.2020.4.01.3800:** O Sr Thiago Fernandes dos Santos, representante da Fundação Renova, rememorou o contexto das famílias para o reassentamento em Gesteira que era um processo que vinha sendo conduzido desde 2020 com a adesão de 31 famílias no reassentamento familiar e 06 para o reassentamento coletivo. Destacou das 06 famílias restantes 05 foi feito um acordo 01 família não aderiu ao acordo coletivo, passível de ação judicial, e ele também beneficiou as outras 31 famílias.

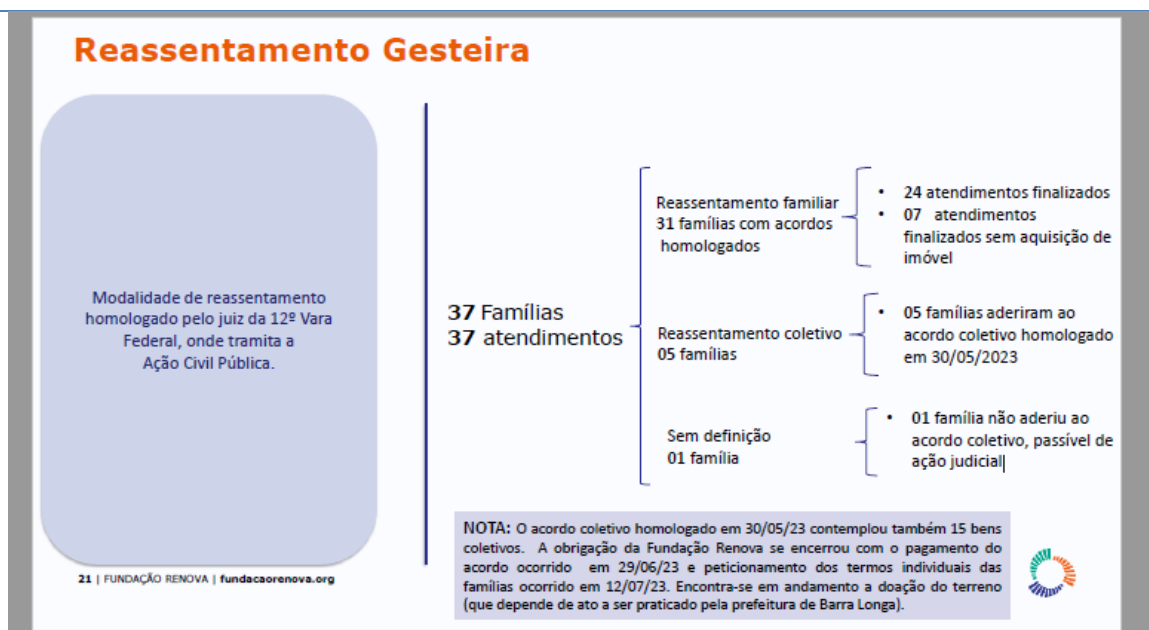

**NOTA: O acordo coletivo homologado em 30/05/23 contemplou também 15 bens coletivos. A obrigação da Fundação Renova se encerrou com o pagamento do acordo ocorrido em 29/06/23 e peticionamento dos termos individuais das famílias ocorrido em 12/07/23. Encontra-se em andamento a doação do terreno (que depende de ato a ser praticado pela prefeitura de Barra Longa).**

Segue link MP que esteve à frente do acordo com todos os detalhes “**Caso Samarco: acordo coletivo garante reconstrução e recuperação da comunidade de Gesteira** <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/caso-samarco-acordo-coletivo-garante-reconstrucao-e-recuperacao-da-comunidade-de-gesteira.shtml>

**2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08:** Sr Thiago Fernandes dos Santos, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques:

i) Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2023): previsão para 2023, valor orçado, projetado, realizado e proj-real.

ii) Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo:

**Linha do Tempo de atividades: Bento Rodrigues:** Previsão de conclusão:- 8 Casas;

- 01 Lotes; - 01 Bem Coletivo em Agosto. **Paracatu de Baixo:** Previsão de conclusão:- 02 casas; - 01 sítio; - 02 Bens Coletivos em Setembro. **Linha do tempo de entregas do Reassentamento familiar:** Previsão de conclusão de 01 casa em agosto e 04 em setembro

iii) Status de Edificações de Bento Rodrigues e Entregas. Avanço real em 31.06.23 85,44  
 Universo de Atendimento: 251 Status em 28/07/23: Concluído: 7 Bens Coletivos; 138 Casas/Comércio/Misto; Concluído: 19 Lotes; Habite-se: 128 Casas/Comércio /Misto/Coletivo; Obra em Andamento: 37 Casa/Comércio/Misto/ Coletivo TRR: 29 Casas/Comércio/Misto/Coletivo

III) Status de Edificações Paracatu e Entregas Avanço de obra real em 31.06.23 = 86,94%  
 Universo de Atendimento: 94 Status em 28/07/23: Concluído: 7 Bens Coletivos; Concluído: 57 Casas/Comércio/Misto/Sítio; Concluído: 2 Lote; Habite-se: 45Casas/Comércio/Misto/Coletivos; Obra em Andamento: 10 Casa/Comércio/Misto/Sítio /Coletivo TRR: 3 Casas/Comércio/Misto/Coletivo Destaque para o Relatório fotográfico as Ações de Fortalecimento de Vínculos Sociais. A Sra. Márcia Mary Silva Pedroso, representante da Comissão de Atingidos dede de Barra longa, Então é coisa absurda. Agora me pega e vem aqui mostrar um tender muito bonito. O projeto da casa que fez para a gente também, mas sem ter participação nossos 2 projetos que fizesse tem participação nosso. Além de tudo, eu tenho um ataque é a nossa casa, não tinha engenheiro, não tinha nada. Eu tenho uma ata que é engenheira, fala que aquela estrutura que é a fundação é nova, pesar. Ela não aguenta um terraço, então quem vai ficar dentro dessa casa? Quem vai? Se um? Se por acaso um dia. Fazer, né? Porque lá nós não queremos mais, entendeu? Nós queremos entrar no reassentamento, que é direito nosso. Tivemos a presença dos Atingidos que trouxeram várias outras pautas para a CT-Infra, A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, propôs um retorno a cidade para uma reunião de escuta com eles a data ainda será definida. Os Atingidos também colocaram outras pautas de não são de responsabilidade

	das CT-Infra contudo a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, disponibilizou o Email da CT para que eles pudessem enviar as solicitações e a CT-Infra encaminhara para a demais CT's.
<b>3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves</b>	
<b>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5</b> <b>Responsável: Fundação Renova</b>	
<b>3.2) Apresentação do status de encerramento da disposição do material removido do reservatório e as condicionantes. Responsável: SAMARCO S/A.</b>	
<b>3.3) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias.</b> <b>Responsável: SAMARCO S/A.</b>	
<b>Discussão</b>	<p><b>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5:</b> A Sra. Úrsula Vasconcelos, representante da Samarco, informou que não houve atualização e por isso a Fundação Renova também não enviou um representante para esse ponto de pauta.</p> <p><b>3.2) Apresentação do status de encerramento da disposição do material removido do reservatório e as condicionantes.</b> O Sr. Gustavo Castro, representante da Samarco, realizou a apresentação dos pontos de pauta, pontuou sobre os trabalhos na Fazenda floresta e conclusão, e destacou a conclusão da Bacia (slide4), com fotos.</p> <p><b>3.3) Atualização de Cronograma das obras Compensatórias.</b> O Sr. Gustavo Castro, representante da Samarco: Destaques para as obras por Município: <b>Rio doce:</b> Total de Condicionantes: 51und; 100% (51 unid.) -Engenharia Iniciadas; 94% (48 unid.) -Diagnósticos Aprovados pelas Prefeituras (Relatório pré-conceitual com a confirmação de entendimento das condicionantes entre as partes); 41% (21 unid.) -Engenharia Concluída. <b>Santa Cruz do Escalvado:</b> Total de Condicionantes: 73und 99% (72 unid.) -Engenharia Iniciadas; 81% (59 unid.) -Diagnósticos Aprovados pelas Prefeituras (Relatório pré-conceitual com a confirmação de entendimento das condicionantes entre as partes);49% (36 unid.) -Engenharia Concluída. ), Bruna da Silva Lopes (Rio Doce), Pontua duas questões relacionadas ao PG 09. Primeiro, confirmou com Sr Gustavo que a desmobilização começaria em setembro conforme apresentação, e realocação da mão-de-obra que estava nessas empresas do Lago para as obras compensatórias, conforme a Prefeitura sempre colocou. É a questão de contratação de mão de obra local que o município sempre colocou como importante, principalmente em questão de população flutuante, que está no município hoje em decorrência das obras. É importante que nessa desmobilização leve em consideração essa transição. Foi solicitado das informações das obras, como data de início e status atual para melhor acompanhamento para a Câmara Técnica Apresentação será anexada no final da Ata.</p>
<b>4.1) Status da aprovação da Taxonomia e análise da CT sobre a conclusão de itens de cláusula do PG-10</b>	
<b>4.2) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.</b>	
<b>4.3) Apresentação Status de Monitoramento do Programa.</b>	
<b>4.4) Conclusão da cláusula 84-e</b>	

<p><b>Discussão</b></p>	<p><b>4.1) Status da aprovação da Taxonomia e análise da CT sobre a conclusão de itens de cláusula do PG-10</b> A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, pontuou aos representantes da Fundação Renova que a Taxonomia, foi analisada pela CT que poderiam considerar como aprovada, porém iria solicitar um ajuste no banco de dados para a CT não que não seja necessário a aprovação com ressalvas. Sobre a conclusão de itens de cláusula do PG-10, haverá também outros ajustes que CT irá solicitar para prosseguir o processo e que ainda não foi possível analisar a Conclusão da cláusula 84-e.</p> <p><b>4.2) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4 1000398-10.2020.4.01.3800:</b> O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, foi apresentado uma linha do tempo com as etapas pós cordo até o momento presente (slide 09), informou que houve uma decisão suspendendo esse processo e estão aguardando o encaminhamento da justiça foram acrescentadas atualizações, pelo Sr. Carlos Sena, sobre o andamento do Eixo08 que trata das Estrutura Rurais. <b><u>Nota: O PG10 possui 20 estruturas rurais complexas pendentes distribuídos entre 11 beneficiários. Todos os beneficiários atendidos pelo PG10 manifestaram o interesse na quitação através da pecúnia.</u></b></p> <p><b>4.3) Apresentação Status de Monitoramento do Programa:</b> O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2023-2024 - PG010. Parque de Exposições de Barra Longa concluído. Destacou a conclusão das pontes Mariana - Bento Rodrigues e Santa Rita. Campo de Futebol de Ponte do Gama: Obras concluídas em 13/06/2023 Campo de Futebol de Pedras: Em fase de Suprimentos; Licenciamento ambiental obtido; Cronograma de execução previsto é de 10 meses ; Campo de Futebol dos Rodoviários – Barra Longa: Embargo judicial expedido determinando a não execução de obras ;Cronograma de execução previsto é 8 meses.; Licenciamento ambiental obtido. Manutenção de Vias Avanço previsto* 98,94% - Avanço real* 98,96%. Apresentação será anexada no final da Ata.</p> <p><b>4.4) Conclusão da cláusula 84-e:</b> O Sr Sergio Ferreira Lima Filho representante da Fundação Renova, formalizou para Câmara Técnica/CÍF em nome da Fundação Renova o cumprimento da <b>cláusula 84-e</b>, as evidências foram enviadas para CT.</p> <p>Conforme lista de presença anexo, tivemos a presença dos Atingidos que trouxeram várias outras pautas para a CT-Infra, acolheu o pedido e propôs um retorno a cidade para uma reunião escuta com eles, data ainda será definida.</p>
-------------------------	---

**Por fim, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros agradeceu a presença de todos. A 70ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura que encerrou-se às dezoito horas e vinte dois minutos**

Ata aprovada por todos os presentes na 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 20 de Agosto de 2023

Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros  
Coordenação da CT-INFRA
