

**ATA DA 71ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA
DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Em vinte de setembro do ano de dois mil e três às três quarenta e um minutos, no Centro Madalena Martins Lima - Rua Coronel Luiz Torres nº 150, Centro, Rio Doce/MG - Teve início a 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

Participantes da 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 15h41min às 17h55min – Dia 20/09/2023.

Andreia Mendes (Comissão de Barra Longa), Ateleia Machado (Prefeitura de Barra Longa), Bruna da Silva Lopes (Rio Doce), Bruno da Silva (Prefeitura do Rio doce), Carlos Sena (Renova), Caroline Braga (Flasco), Francine Aparecida Souza (SETRANS), Gabriela Barbosa (EY), Helen Roberta de Oliveira Araújo (SEMAD), Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros (SEINFRA), Marcelo Mol (Samarco), Marcia Mary (Comissão de Barra Longa), Mariana Valadão (EY), Roandes Martins (Prefeitura de Barra Longa), Simone Silva (Atingida), Sergio Ferreira Lima Filho (Renova), Thiago Fernandes dos Santos (Renova), Úrsula Vasconcelos (Samarco) e Vaneide Carvalho (SEINFRA).

1) Informes Gerais

1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 70ª

Discussão	A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, saudou a todos os presentes e os consultou ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 70ª Reunião Ordinária que colocada em votação foi aprovada, sem objeções. Estavam presentes o Prefeito de Acaiaca/MG Sr. Luiz Carlos Faustino e seu Assessor Anderson Faustino, que vieram representar o pleito de Acaiaca/MG para ser reconhecida como município atingindo, contudo, como explicou a Sra. Juliana, devido aos problemas de atraso na rodovia não foi possível a CT chegar a tempo para a Reunião fechada, dessa forma acordou que será realizada uma reunião online com os representantes de Acaiaca em data próxima para análise do pleito.
------------------	---

2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.

2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG8.


Discussão	2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3 nº 1042050-07.2020.4.01.3800: O Sr Thiago Fernandes dos Santos, representante da Fundação Renova, rememorou o contexto das famílias para o reassentamento em Gesteira que era um processo que vinha sendo conduzido desde 2020 com a adesão de 31 famílias no reassentamento familiar, 05 para o reassentamento coletivo e 01 família não aderiu ao acordo coletivo, passível de ação judicial.
------------------	--

Reassentamento Gesteira

Modalidade de reassentamento homologado pelo juiz da 12ª Vara Federal, onde tramita a Ação Civil Pública.

37 Famílias	Reassentamento familiar 31 famílias com acordos homologados	<ul style="list-style-type: none"> • 24 atendimentos finalizados • 07 atendimentos finalizados sem aquisição de imóvel
37 atendimentos	Reassentamento coletivo 05 famílias	<ul style="list-style-type: none"> • 05 famílias aderiram ao acordo coletivo homologado em 30/05/2023
	Sem definição 01 família	<ul style="list-style-type: none"> • 01 família não aderiu ao acordo coletivo, passível de ação judicial

NOTA: O acordo coletivo homologado em 30/05/23 contemplou também 15 bens coletivos. A obrigação da Fundação Renova se encerrou com o pagamento do acordo ocorrido em 29/06/23 e peticionamento dos termos individuais das famílias ocorrido em 12/07/23. Encontra-se em andamento a doação do terreno (que depende de ato a ser praticado pela prefeitura de Barra Longa).



NOTA: O acordo coletivo homologado em 30/05/23 contemplou também 15 bens coletivos. A obrigação da Fundação Renova se encerrou com o pagamento do acordo ocorrido em 29/06/23 e peticionamento dos termos individuais das famílias ocorrido em 12/07/23. Encontra-se em andamento a doação do terreno (que depende de ato a ser praticado pela prefeitura de Barra Longa).

Segue link MP que esteve à frente do acordo com todos os detalhes “**Caso Samarco: acordo coletivo garante reconstrução e recuperação da comunidade de Gesteira** <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/caso-samarco-acordo-coletivo-garante-reconstrucao-e-recuperacao-da-comunidade-de-gesteira.shtml>

2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08: Sr Thiago Fernandes dos Santos, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques:

i) Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2023): previsão para 2023, valor orçado, projetado, realizado e proj-real.

ii) Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo:


Linha do Tempo de atividades: Bento Rodrigues: Previsão de conclusão:- 8 Casas;

- 01 Lotes; - 01 Bem Coletivo em setembro. **Paracatu de Baixo:** Previsão de conclusão:03 casas; - 01 sítio; - 04 Bens Coletivos em outubro **Linha do tempo de entregas do Reassentamento familiar:** Previsão de conclusão de 03 casa em setembro e 05 casas em outubro.

iii) Status de Edificações de Bento Rodrigues e Entregas. Avanço real em **31.08.23 88,17%** **Universo de Atendimento 249** - Status em 08/09/2023: **Concluído:** 7 Bens Coletivos;138 Casas/Comércio/Misto;19 Lotes. **Habite-se:** 132 Casas/Comércio/Misto/Coletivo. **Obra em Andamento:** 37 Casa/Comércio/Misto/Coletivo – Relatório fotográfico

III) Status de Edificações Paracatu e Entregas **Avanço de obra real em 31.08.23 = 88,44%** **Universo de Atendimento:** 92 Status em 08/09/2023: **Concluído:** 7 Bens Coletivos; 57 Casas/Comércio/Misto/Sítio; Concluído: 2 Lote. **Habite-se:** 44 Casas/Comércio/Misto/Coletivos; **Obra em Andamento:** 10 Casa/Comércio/Misto/Sítio/Coletivo. **TRR:** 12 Casas/Comércio – Relatório fotográfico. Foi apresentado em detalhe “Atendimentos Indefinidos”.

Dos 71 atendimentos de Reassentamento sem definição de modalidade
Famílias que não assinaram TOR ou TOP

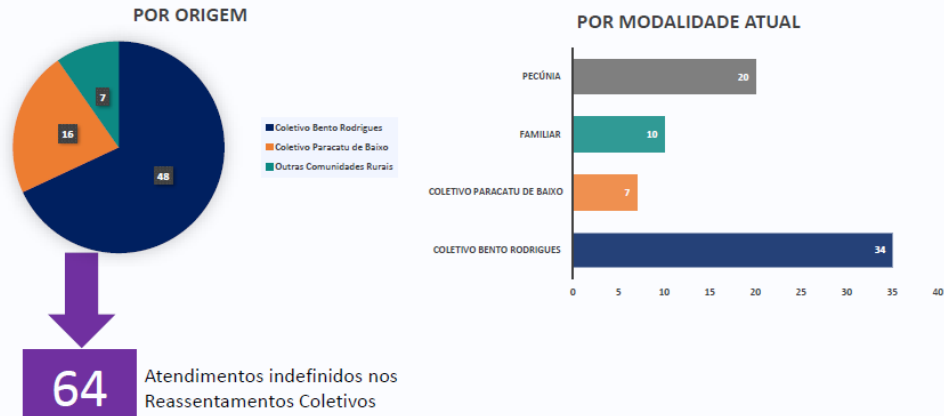

TOR | Termo de Opção ao Reassentamento
TOP | Termo de opção à Pecúnia
Fonte: Gestão Social Reassentamento 30/08/2023
Bens Coletivos não estão contabilizados, pois não há possibilidade de mudança de modalidade destas edificações.

3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5

Responsável: Fundação Renova

3.2) Condicionantes do Processo Administrativo SLA n. 1496/2020 Cronograma das obras, em especial quanto ao Prazo de Início e Finalização Status das obras em andamento; Cronograma de Condicionantes Ambientais; Prazo de entrega de equipamentos. Responsável: SAMARCO S/A.

3.3) Cronograma das atividades de dragagem e deposição de rejeitos do lago Candonga.

Responsável: SAMARCO S/A.

3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5: A Sra. Úrsula Vasconcelos, representante da Samarco, informou que não houve atualização e por isso a Fundação Renova também não enviou um representante para esse ponto de pauta.

3.2) Condicionantes do Processo Administrativo SLA n. 1496/2020 Cronograma das obras, em especial quanto ao Prazo de Início e Finalização Status das obras em andamento; Cronograma de Condicionantes Ambientais; Prazo de entrega de equipamentos. Sr. Marcelo Mol, representante da Samarco, realizou a apresentação dos pontos de pauta, pontuou o Cronograma de Condicionantes houve uma reunião específica para tratar desse tema e que as tratativas estão bem avançadas.

Discussão

LOC 1496/2020 _ CRONOGRAMA DAS OBRAS

OBRAS COM EXECUÇÃO EM ANDAMENTO			NÃO OBRAS DE CONTRAPARTIDA SOCIAL EM ANDAMENTO (sociais e ambientais)		
Item	Cond.	MARCOS	Item	Cond.	MARCOS
1	65	Construção Centro de Físio. - R. Doce	1	1	Capacitação dos servidores da Secretaria Municipal de Educação de Rio Doce
2	28	Implantação da Policlínica de -St. Cruz	2	27	Capacitar os servidores públicos do Município de Santa Cruz do Escalvado
3	55.56	Revitalização Parque Expo -St. Cruz	3	55.6	Programa de capacitação profissional Rio Doce
4	67.1	Implantação Projeto Passeio - R. Doce	4	55.39	Programa de capacitação profissional Santa Cruz Escalvado
5	55.32.2	Rev. Posto Saúde Zito Soares - St. Cruz	5	12.13	Compensação Ambiental das APP no município de Rio Doce
6	58.9	Campo Fut. Santana Deserto - R. Doce	6	11.1	Recuperação do Córrego das Lajes
7	12.4.2	Reforma Pavimento S. Deserto - R. Doce	7	12.11	Elaboração e implementação do Plano de Arborização
8	55.72	Pavimentação s/álm Merengo - St. Cruz	8	55.82	Compensação Ambiental das APPs (Áreas de Preservação Permanente) no município de Santa Cruz do Escalvado
9	55.25.2	Recup. Ponte S. Ant. S. Deserto - R. Doce	9	14	Plano de Desenvolvimento da Economia local no município de Rio Doce
10	PSCE07.1.3	Reforma da escola N. Soberbo - St. Cruz	10	31	Plano de Desenvolvimento da Economia local do Município de Santa Cruz do Escalvado
11	12.2.2	ETA Santana Deserto - R. Doce	11	39	Programa de Educação Ambiental Unificado
12	11.3	ETE Santana Deserto - R. Doce	12	30	Plano de Controle da febre maculosa
13	55.48.5	Cemitério Novo Soberbo	13	61	Custeio da Revisão do Plano Diretor de Rio Doce
14	55.32.4	Rev. Posto Saúde Porto Plácido	14	40	Projeto de Coleta Seletiva
15	55.32.3	Rev. Posto Saúde Novo Soberbo	15	26	Plano Municipal de Turismo
16	PSCE03.4	Taludes Críticos - St. Cruz	16	PSCE08	Revitalização das propriedades rurais da margem direita
17	PSCE03.3	Desassoreamento do córrego sede - St. Cruz			
18	17	Pavimentação Pedra do Escalvado - St. Cruz			
19	55.32.5	Rev. Posto Saúde Vargem Alegre - St. Cruz			

Total de Condicionantes obras em andamento: 19

- 8 Rio Doce
- 11 Santa Cruz do Escalvado




Total de Condicionantes não obras em andamento:

- 7 Rio Doce
- 8 Santa Cruz do Escalvado
- 1 Rio Doce + Santa Cruz

3.3) Cronograma das atividades de dragagem e deposição de rejeitos do lago Candonga. representante da Samarco, realizou a apresentação do ponto de pauta, apresentação em detalhes consta no final da Ata.

PROJETO: CANDONGA – UHE RISOLETANEVES MOVIMENTO DE MASSA SETOR 11		ANO 2023										Ano 2024
Item	Atividade	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1	Emissão da O.S.	.										
2	Término da Mobilização Equipamentos / Mão de obra		.									
3	Início das atividades		.									
4	Termino do Contrato									.		
5	Mobilizações											
6	Disposição de Sedimentos em Bacias											
7	Empilhamento 98% P.N											
8	Estabilização Estruturas Setor 11											
9	Descomissionamento Setor 5B											
10	Sistema de drenagem											
11	Sistema de drenagem Complementar											
12	Desmobilizações											

Legenda

	A iniciar
	Em andamento
	Concluído

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.

4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa.

Discussão

4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4 1000398-10.2020.4.01.3800: O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, apresentou uma linha do tempo com as etapas e como foi explicado anteriormente houve a suspensão do Sistema Novel Infraestrutura em 17/07/23 está em definição o cenário de Implementação do Acordo do Eixo 4, bem como os prazos de retomada das adesões, pagamentos, encerramento do Eixo 4 e dos beneficiários de moradias temporárias.

4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa: O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, apresentou o Planejamento 2023-2024 - PG010. Destaque para Drenagem Rua Capitão Manoel Carneiro x Rua 1º De Janeiro: Escopo incluso no repasse de recursos para a quitação das obras públicas no município de Barra Longa. Repasse a PMBL homologado em 30/06/23, pagamento realizado em 13/07/23. (84e A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, pontuou como positivo que terem incluído a referência a qual item da Taxonomia no conteúdo da apresentação do PG10. **Campo de Futebol de Pedras:** Em fase de Suprimentos; Licenciamento ambiental obtido; Cronograma de execução previsto é de 10 meses **Campo de Futebol dos Rodoviários – Barra Longa:** Embargo judicial expedido determinando a não execução de obras. Demanda em tratativa pelo Jurídico e Licenciamento. Cronograma de execução previsto é de 8 meses. Manutenção de vias com avanço previsto de 99,78%, avanço real 99,63%. Apresentação será anexada no final da Ata. **Obras em andamento - Manutenção de Vias Não Pavimentadas – Trecho: Monsenhor Horta x Ponte do Gama; Manutenção da galeria no trevo de Paracatu x Águas Claras; Execução de Bueiro em Barreto; Execução de Drenagem em Ponte do Gama; Gabião do lado direito da via no Rio do Carmo em Acaiaca (Em mobilização.)** Apresentação no final da Ata.

Por fim, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros agradeceu a presença de todos. A 71ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura que encerrou-se às dezessete horas e cinquenta e cinco minutos





Ata aprovada por todos os presentes na 72ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 22 de novembro de 2023

Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros
Coordenação da CT-INFRA
