

**ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA  
DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA**

Em trinta e um de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro as quinze horas e cinquenta e dois minutos, no Hotel Max Savassi R. Antônio de Albuquerque, 335 - Savassi, Belo Horizonte - MG, 30112-010- Teve início a 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura (CT-Infra), constituída no âmbito do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) e do Termo de Ajustamento de Conduta Governança (TAC-Gov), ambos Acordos referentes ao Desastre da Samarco em Mariana/MG. Antes, no período das 14:00h às 15:00h foi realizada reunião interna, restrita aos membros da Câmara Técnica, atingidos, assessorias técnicas e convidados. Após apresentação dos membros e participantes, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, fez a leitura da pauta e iniciou o debate dos itens na reunião aberta, conforme descritos a seguir:

**Participantes da 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura – Pública - Horário das 15h52min às 19h04min – Dia 31/01/2024.**

Aleteia Flavia Machado (Barra Longa), Andreia Mendes (Comissão de Barra Longa), Antônio Áureo (Rio Doce), Bruna da Silva Lopes (Rio Doce), Carlos Sena (Renova), Caroline Braga (Flacso), Cristina (Barra Longa), Cleber (Rio Doce), Francine Aparecida Souza (SETRANS), Guilherme Freitas (Barra Longa), Helen Roberta de Oliveira Araújo (SEMAD), Jose Paulo (Renova), Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros (SEINFRA), Júlio (Barra Longa), Laura Freitas (Barra Longa), Luis (Barra Longa), Marcelo Mol (Samarco), Mariana Valadão (EY), Renata Soares (Barra Longa), Roandes Geraldo Martins (Barra Longa), Romulo Romes (Barra Longa), Sergio Ferreira Lima Filho (Renova), Simone Silva (Barra Longa), Úrsula Vasconcelos (Samarco), Vaneide Carvalho (SEINFRA) e Wagner (Barra Longa).

**1) Informes Gerais**

A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, saudou a todos os presentes e consultou sobre a solicitação da Fundação Renova para a inversão da Pauta iniciando as apresentações com PG10 – Recuperação das Comunidades e Infraestruturas Impactadas, não houve objeções. Para registro de Ata seguiremos a Pauta.

**1.1) Aprovação da Ata referente à Reunião Ordinária de 72ª**

<b>Discussão</b>	A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, consultou quanto ao recebimento e possíveis manifestações sobre a Ata da 72ª Reunião Ordinária que colocada em votação foi aprovada, sem objeções.
------------------	---


**2) PG08 – Acompanhamento das atividades do Reassentamento – Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira.**

**2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3.**

**2.2) Apresentação status do monitoramento do PG8.**

**2.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 3 nº 1042050-07.2020.4.01.3800:**

O Sr Jose Paulo, representante da Fundação Renova, rememorou o contexto das famílias para o reassentamento em Gesteira que era um processo que vinha sendo conduzido desde 2020 com a adesão de 31 famílias no reassentamento familiar, 05 para o reassentamento coletivo e 01 família não aderiu ao acordo coletivo, passível de ação judicial.

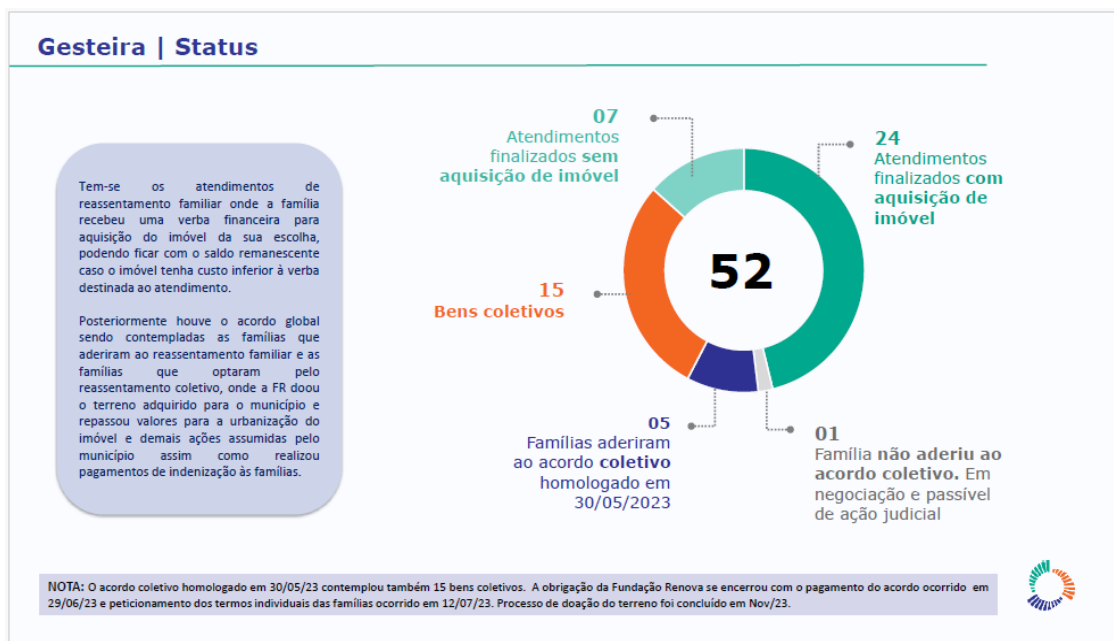

Discussão

**NOTA: O acordo coletivo homologado em 30/05/23 contemplou também 15 bens coletivos. A obrigação da Fundação Renova se encerrou com o pagamento do acordo ocorrido em 29/06/23 e peticionamento dos termos individuais das famílias ocorrido em 12/07/23. Processo de doação do terreno foi concluído em Nov./23**

**2.2) Apresentação status do monitoramento do PG-08** O Sr Jose Paulo, realizou a apresentação do Status do PG-08, com os destaques:

i) Investimento no Programa de Reassentamento considerando os valores executados (2015 a 2023): previsão para 2023, valor orçado, projetado, realizado e proj-real.

ii) Apresentação da descrição de Grandes Números para Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo:

**Linha do Tempo de atividades: Bento Rodrigues** - Conclusão;03 Casas; 02 Lotes e 01 Aceite de Pecúnia Geral dezembro 2023; Previsão de conclusão: 5 Casas; 03 Bens Coletivos e 01 Lote em janeiro, para fevereiro/2024 04 casas. Acumulado 2023: Casa 154; Bem Coletivo 18; Lote: 42; Aceite de Pecúnia Geral 33.

**Paracatu de Baixo:** Conclusão;02 Bens coletivos 01 Aceite de Pecúnia Geral. Previsão de conclusão - 01 Bens Coletivos e 03 sítios em janeiro, para fevereiro/2024 02 Bens Coletivos. Acumulado 2023: Casa 53; Bem Coletivo 12; Lote 02; Sítio 01; Aceite de Pecúnia Geral 16.

**Linha do tempo de entregas do Reassentamento familiar - Conclusão dezembro 2023:** 05 Casas; 01 Aceite de Proposta de Autogestão e Verba; 02 Aceites de Pecúnia Geral; 02 Aceites de Pecúnia

<p><b>Discussão</b></p>	<p>NN. Previsão de conclusão de 01 casa em janeiro/2024 sem entregas previstas para fevereiro. <u>Acumulado 2023: Casas 42; Lotes 03; Aceites de Propostas de Autogestão e Verba 40; Aceites de Pecúnia Geral 70 Aceites de Pecúnia NN 84; Reconstruções 14.</u></p> <p><u>iii) Status de Edificações de Bento Rodrigues e Entregas.</u></p> <p><b>Avanço real em 31.08.23 88,17% (Avanço congelado devido a revisão de cronograma, valor congelado em 08/2023.)</b> Universo de Atendimento 250 - Obras Concluídas 9 Bens Coletivos; 152 (Casa, Comércio, Misto); 22 Lotes. Obras em Andamento: 27 (Casa, Comércio, Misto, lote e coletivo). Habite-se 148 (Casa, Comércio, Misto). TTPI/Entrega de Chaves 116 (Casa, Comércio, Misto, lote e coletivo). Relatório fotográfico.</p> <p><u>III) Status de Edificações Paracatu e Entregas</u></p> <p><b>Avanço real em 31.08.23 88,34% Status 12/01/2424</b> Universo de Atendimento 95 - Obras Concluídas 12 Bens Coletivos; 61 (Casa, Comércio, Misto e sítios); 02 Lotes. Obras em Andamento: 03 (coletivos). Habite-se 62(Casa, Comércio, Misto). TTPI/Entrega de Chaves 49 (Casa, Comércio, Misto, lote e coletivo). Relatório fotográfico.</p> <p><b>Familiar Status Avanço real em 31.08.23 88,15%</b> Status 12/01/2024 Universo de Atendimento 120 - 42 casas + 3 lotes; 40 Autogestão/Apro 30; 14 Reconstruções; Em andamento: 3 casas; À Iniciar: 16 Casas + 2 Lotes. Universo de Atendimento: 210 - Concluído: 119 Pecúnia Geral; Concluído: 84 Pecúnia Novo Núcleo À Iniciar: 7 Pecúnia Geral. Relatório fotográfico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atendimentos sem assinatura de TOR (Termo de opção ao reassentamento)</li> </ul> <p>Bento rodrigues: 24 Coletivo – Familiar 4– Pecúnia 0; Paracatu de Baixo 05 Coletivo – Familiar 04 – Pecúnia 02; Outras Comunidades Rurais:– Familiar 1 – Pecúnia 5</p>
<p><b>3) PG09 – Recuperação UHE Risoleta Neves</b></p>	
<p><b>3.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 5-</b> <b>Responsável: Fundação Renova</b></p>	
<p><b>3.2) Condicionantes do Processo Administrativo SLA n. 1496/2020 Cronograma das obras, em especial quanto ao Prazo de Início e Finalização Status das obras em andamento; Cronograma de obras prioritárias do Município de Rio Doce; Prazo de entrega de equipamentos. Responsável: SAMARCO S/A.</b></p>	
<p><b>3.3) Cronograma das atividades de dragagem e deposição de rejeitos do lago Candonga.</b> <b>Responsável: SAMARCO S/A.</b></p>	
<p><b>Discussão</b></p>	<p>Devido à inversão de pauta e tempo gasto nas discussões dos temas apresentados, não foi possível para a SAMARCO S/A realizar a apresentação dos temas solicitados, como foi enviado a apresentação para a Câmara técnica, foi acordado que os membros iriam analisar esse material e sendo necessário seria marcado uma reunião online com a SAMARCO S/A. A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros,</p>

	Coordenadora da CT-Infra, agradeceu aos representantes o Sr. Marcelo Mol e a Sra. Úrsula Vasconcelos pelo comparecimento e compreensão.
	<b>4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4.</b>
	<b>4.2) Apresentação status do monitoramento do PG10.</b>
	<b>4.3) [PG10-PG32] Reporte de ocorrência no Poço 01 – Distrito de Gesteira Mutirão.</b>
	<b>4.4) PG-10: Conclusão das Cláusulas 84-alínea "b".</b>
<b>Discussão</b>	<p><b>4.1) Atualização sobre o Eixo Prioritário 4 1000398-10.2020.4.01.3800:</b></p> <p>O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, pontuou sobre a audiência realizada no dia 23/012024, onde a Fundação Renova informou que já possui comprovação dominial (matrículas de registro) de mais de 800 imóveis, e que vem se empenhando em identificar os corretos possuidores ou proprietários dos demais imóveis já submetidos à avaliação. Ainda durante a audiência, a Fundação Renova comprometeu-se a apresentar um fluxo de atendimento mais detalhado dos atingidos até 06/02/2024.</p> <p><b>4.2) Apresentação Status de Monitoramento do Programa:</b></p> <p>O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, apresentou ESCOPO PG10: CLÁUSULA 82 A 88 TTAC. Em recorte a informação das Notas Técnicas nº 24/2023; 26/2023. Seguindo as referências a qual item da Taxonomia do PG10. Destaques para as obras concluídas com fotos.</p> <p>Tivemos a presença de representantes de vários setores da Prefeitura de Barra Longa e representantes jurídicos de Atingidos, onde foram feitas diversas colocações sobre temáticas relacionadas a outras câmaras técnicas e sobre a infraestrutura, como a informação sobre o muro do Parque de Exposições de Barra Longa – IC 84, uma obra entregue, onde segundo os relatos que o muro caiu e existe a presença de rachaduras. O Sr. Carlos Sena, pontuou que toda obra está sujeita a isso e que a obra do Parque de Exposições de Barra Longa, tem garantia da construtora responsável pelos reparos. A Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, orientou esses representantes sobre qual é escopo da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, e os temas acompanhados nas reuniões conforme as cláusulas do TTAC, e quanto ao seu papel de atuação junto a Fundação de Renova, houve colocações de que e-mails dos Atingidos e Ofícios enviados pela Prefeitura de Barra Longa, não estariam sendo respondidos, a Sra. Juliana explicou que sem a socialização dos temas e o acionamento por parte da Prefeitura de Barra Longa, da Câmara Técnica de Infraestrutura não era possível acompanhar essas informações. Orientou que os representantes organizem um fluxo dos temas relacionados a Infraestrutura que desejam respostas e resoluções com a Fundação de Renova, é que façam encaminhamento como solicitação de ponto de pauta. Explicou também que questões específicas como a temas judicializados não há possibilidade de atuação direta da CT-Infra, a Câmara Técnica atua como colaboradora CÍF/AGU no fornecimento de subsídios quando é solicitado . <b>Obras em Execução: PF8100 – Drenagem da ADME (Área Deposição de</b></p>

**Material Excedente) e RCC (Resíduos de Construção Civil) – IC 84o** Implantação de aterro de resíduos de construção civil na Fazenda Vista Alegre no município de Barra Longa. Início: Dez/2023 | Término previsto: Abr/2024

**PF8100 – Manutenção de Vias Pavimentadas e Não Pavimentadas – IC 84o** Serviços de manutenção corretiva, serviços de urgência e melhorias, como construções e reparações dos dispositivos do corpo estradal e fortuita movimentação de terra em vias pavimentadas e vias não pavimentadas. Início: Jan/2017 | Término previsto: Nov./2024

**PF8110 – Manutenção de Edificações** Obras de construção civil relativas a manutenções dos imóveis de origem sob responsabilidade da Fundação Renova, bem como obras de infraestrutura (esgoto, rede elétrica e outros) localizadas nos municípios de Barra Longa/MG, Mariana/MG e seus distritos/subdistritos. Início: Jan/2017 | Término previsto: Nov/2024

**Manutenção em Moradias Temporárias** Obras civis relativas a manutenções em moradias temporárias Início: Jul/2019 | Término previsto: Dez/2024

**Obras a Iniciar: PF0152-ReformadaQuadraVoltadaCapela–Município: Barra Longa –IC84he84r**

Status: Em fase de conclusão Início previsto: Abr./2024 Término previsto: Dez/2024


**PF0152-Reconstrução do Campo Municipal (Rodoviários)– Município: Barra Longa–IC84he84r**

Status: Em fase de conclusão Início previsto: Abr./2024 Término previsto: Dez/2024

**PF0152-Reconstrução do CampodePedras–Município: Mariana–IC84he84r**

Status: Em fase de conclusão Início previsto: Abr./2024 Término previsto: Fev/2025 **Extra Pauta) A**

Fundação Renova acrescentou dentro da pauta do PG10 uma explicação sobre o **EIXO 8** - Judicializado na ACP155Bi Econômico, foi apresentado Status de acompanhamento de itens PF0038 - Estruturas Rurais Complexas (Eixo 8) Escopo: 193 Estruturas rurais complexas, sendo 20 estruturas pertencente ao PG10 e 173 estruturas atendidas pelo PG17.

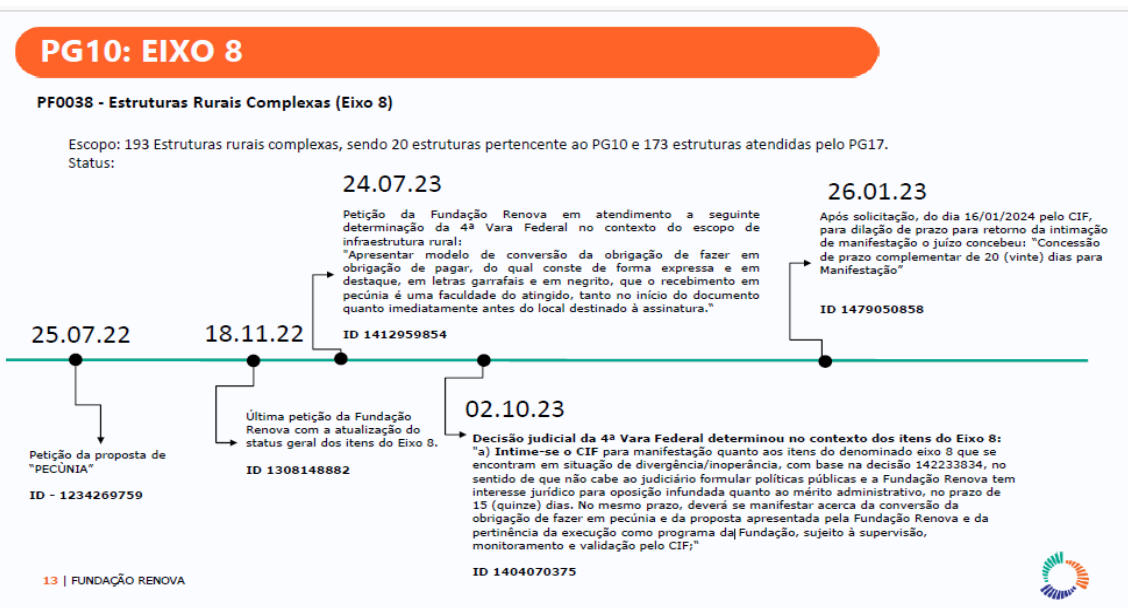

**4.3) [PG10-PG32] Reporte de ocorrência no Poço 01 – Distrito de Gesteira Mutilão.**

O Sr. Carlos Sena, representante da Fundação Renova, prosseguindo a apresentação fez o Reporte de ocorrência no Poço 01 – Distrito de Gesteira Mutirão, trazendo ciência para Câmara Técnica/CIF do cumprimento do cumprimento do Cláusula 84, alínea "p", pontuando que houve a entrega para Prefeitura de Barra Longa, possuem a documentação de referência. O Sr. Sergio Ferreira Lima Filho, representante da Fundação Renova, pontuou que a da Fundação Renova trouxe o tema como as Cláusulas anteriores, sem a discussão do mérito do ocorrido no dia 21/12/2023.

### PG10: SAA Gesteira "84p"

**Comunicação à PMBL, CT-Infra, CT-SHQA e CIF sobre o vandalismo do dia 21/12/23 com destruição total da edícula do poço 01, cláusulas 84p (PG10) e 171 (PG32):**

- 84p: Recuperação das estruturas de captação, tratamento e distribuição de água impactadas;
- 171: Construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água

**Do cumprimento das obrigações pela Fundação Renova:**

- Após a reparação principal que era de sua incumbência, desde 2017, por reiteradas vezes a Fundação Renova consertou danos causados por vandalismo;
- Até mesmo os danos constatados no imóvel por meio de laudo pericial A23687, do EIXO 4. Nesse sentido, em 18.08.2023, a equipe da CTInfra e da auditoria independente dos programas, a Ernst & Young ("EY") visitou as obras já finalizadas, constando a edícula – onde antes havia uma trinca apontada no laudo pericial acima citado –, integralmente reparada;
- Além disso, a todo momento houve acompanhamento da Prefeitura de Barra Longa e da comunidade a respeito do cumprimento do Termo de Compromisso, tendo inclusive havido anuência expressa a respeito da estrutura do Poço 01;
- Cumpre reiterar, ademais, que por meio do Acordo Judicial celebrado nos autos do processo nº 1000321-98.2020.4.01.3800 ("Eixo Prioritário nº 3"), houve depósito judicial de verba para melhorias no Distrito de Gesteira Mutirão (Cláusula 7ª);
- Diante de todo o exposto, a FUNDAÇÃO se utiliza do presente para (i) reiterar à CT-Infra e ao Sistema CIF acerca da ocorrência do último dia 21.12.2023, (ii) reiterar o cumprimento, no que diz respeito à Comunidade de Gesteira Mutirão, das obrigações assumidas por meio da Cláusula 84, "p", e da Cláusula 171, do TTAC, e (iii) requerer que o tema seja pautado na próxima reunião ordinária da CT-Infra de modo a prosseguir com os procedimentos de formalização da quitação da Cláusula 84, "p", e da Cláusula 171, do TTAC.



Os representantes da Prefeitura de Barra Longa e representantes jurídicos de Atingidos, fizeram colocações a respeito da qualidade da água e da veracidade das análises apresentadas para a população, questionaram sobre o local do poço 2, informando que queriam o poço em outro local e já havia em terreno disponível, e queriam o direito a participação nesse processo. E questionaram quanto ao do cumprimento da Cláusula 84, alínea "p", a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros, Coordenadora da CT-Infra, explicou que processo de baixa de Cláusula segue a Deliberação 556 e tudo relacionado a infraestrutura é verificado antes da baixa efetiva que as demais questões apresentadas deveriam ser direcionadas para a CT-SHQA, orientou como encaminhamento que a Fundação Renova deveria encaminhar a documentação de autorização da outorga do IGAM para a CT-SHQA, e dar ciência para CT-Infra da entrega dessa documentação.

**4.4) PG-10: Conclusão das Cláusulas 84-alínea "b"** A Sra. Juliana, informou a Fundação Renova, que a CT-Infra, realizou a análise e estando de acordo com Conclusão das Cláusulas 84-alínea "b" encaminhou como pauta para 74ª Reunião Ordinária do Comitê Interfederativo.

\*Todas as Apresentações estão anexas a Ata.

**Por fim, a Sra. Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros agradeceu a presença de todos. A 73ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação da Infraestrutura que encerrou-se às dezenove horas e quatro minutos.**

Ata aprovada por todos os presentes na 74ª Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Reconstrução e Recuperação de Infraestrutura, no dia 20 de março de 2024



Juliana Ferraz de Magalhães Medeiros

Coordenação da CT-INFRA



Apresentações da  
73ª Reunião Ordinária
